


KAI Winter 2024

Aufgabe 4 Projektmanagement

20

Ihr Vorgesetzter beauftragt Sie mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen. Dazu haben Sie bereits eine Vorgangsliste (Anlage 2) erstellt.

- 4.1 Erläutern Sie kurz, aus welchem Grund der Planungsphase bei der Abwicklung eines Projekts eine hervorgehobene Bedeutung zugeschrieben wird. 2
- 4.2 Erläutern Sie einen weiteren Erfolgsfaktor, um Projekte erfolgreich zum Abschluss zu bringen. 2
- 4.3 Auf Basis der Vorgangsliste in Anlage 2 wurde folgender Netzplan erstellt:

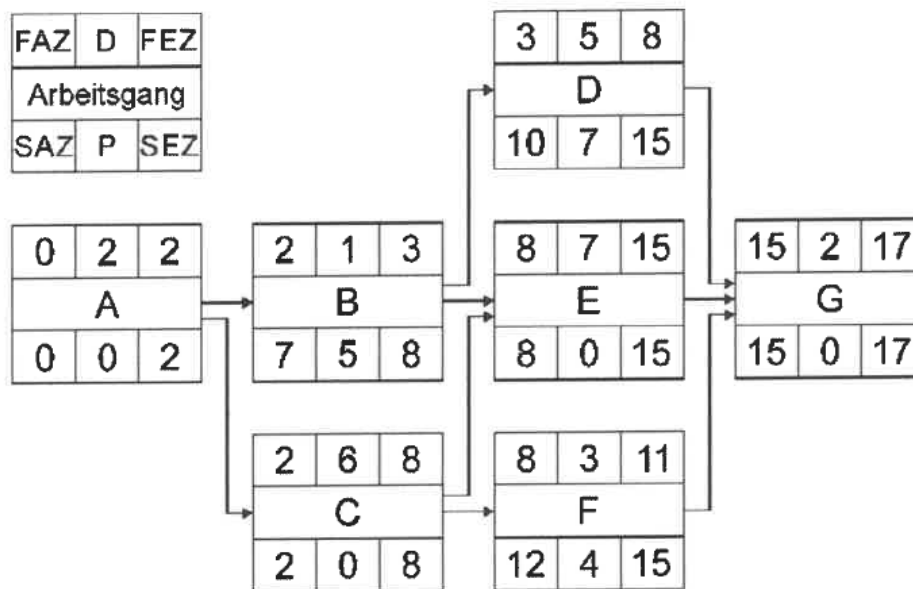

Legende:

D	Dauer in Tagen	P	Puffer in Tagen
FAZ	Frühester Anfangszeitpunkt	SAZ	Spätester Anfangszeitpunkt
FEZ	Frühester Endzeitpunkt	SEZ	Spätester Endzeitpunkt

- 4.3.1 Ermitteln Sie die minimale Dauer des Projekts. 2
- 4.3.2 Geben Sie die Arbeitsgänge auf dem Kritischen Pfad an. 2
- 4.3.3 Erläutern Sie kurz, welche Bedeutung der Kritische Pfad bei der Durchführung des Projekts hat. 2
- 4.3.4 Der Vorgang F verzögert sich um 6 Tage. Erläutern Sie, wie sich die Verzögerung auf das Projekt auswirkt. 2
- 4.4 Erstellen Sie mithilfe der Vorgangsliste (Anlage 2) das Belastungsdiagramm in Anlage 3. 8

Bestimmen Sie die Tage, an denen die maximale Anzahl Mitarbeiter vor Ort sein muss und geben Sie die in diesem Zeitraum erforderliche Anzahl Mitarbeiter an.

Hinweis:

Planen Sie so, dass alle Arbeitsgänge möglichst früh beginnen sollen.

Anlage 2 „Vorgangsliste“ zu Aufgabe 4

Vorgangsliste				
Arbeitsgang	Vorgänger	Beschreibung	Dauer in Tagen	täglich erforderliche Anzahl Mitarbeiter
A	—	Vorbereitende Planung	2	2
B	A	Hardware bestellen	1	3
C	A	Allgemeine Elektroarbeiten	6	2
D	B	Verkäufsräume verkabeln	5	6
E	B & C	IT in Verkaufsräumen installieren und in Betrieb nehmen	7	8
F	C	IT in der Zentrale installieren und in Betrieb nehmen	3	3
G	D & E & F	Abnahme und Übergabe	2	3

Anlage 3 „Belastungsdiagramm“ zu Aufgabe 4

