

Ausgangsszenario:

Als Auszubildender der IT-Firma *ConSystem GmbH* sollen Sie weitere Erfahrungen in der Projektplanung sammeln. Dazu werden Sie mit der Zeitplanung eines Softwareprojektes betraut.

Aufgabenstellung:


Die Phasen für das Projekt sind bereits vorgeplant. Setzen Sie diese Vorgabe in einem Gantt-Diagramm um und kennzeichnen Sie den kritischen Pfad des Projektes.

Planung des Software-Projektes

Vorplanung der Phasen:

Nr.	Phase	Dauer	Vorgänger
A	Analyse	1	–
B	Planung	4	A
C	Design 1	3	A
D	Modul 1	6	C, B
E	Design 2	4	B
F	Modul 2	8	E, D
G	Testphase Design 1	5	C
H	Übergabe	3	F, G

Ihr Gantt-Diagramm (inkl. kritischem Pfad):

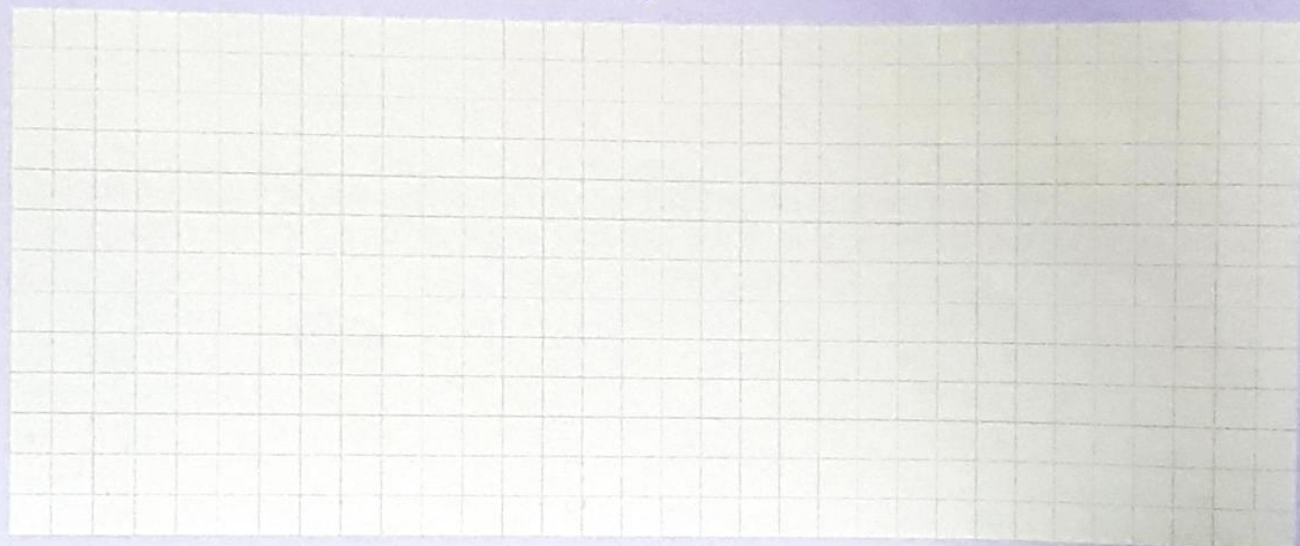

Ausgangsszenario:

Als Auszubildender der IT-Firma *ConSystem GmbH* sollen Sie weitere Erfahrungen in der Projektplanung sammeln. Dazu werden Sie mit der Zeitplanung eines Softwareprojektes betraut.

Aufgabenstellung:


Nach der erfolgreichen Umsetzung als Gantt-Diagramms soll zusätzlich ein Netzplan erstellt werden. Setzen Sie diese Vorgabe in einem Netzplan um und geben Sie den kritischen Pfad des Projektes an.

Planung des Software-Projektes

Vorplanung der Phasen:

Nr.	Phase	Dauer	Vorgänger
A	Analyse	1	–
B	Planung	4	A
C	Design 1	3	A
D	Modul 1	6	C, B
E	Design 2	4	B
F	Modul 2	8	E, D
G	Testphase Design 1	5	C
H	Übergabe	3	F, G

Vorgabe Netzplanelement:



FAZ = frühester Anfangszeitpunkt
SAZ = spätester Anfangszeitpunkt
FEZ = frühester Endzeitpunkt
SEZ = spätester Endzeitpunkt
D = Dauer des Vorgangs
P = Pufferzeit

Ihr Netzplan (inkl. kritischem Pfad):

